

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



T.C

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

**2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

HAZIRLAYANLAR

Şuayip CENGİZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Cevriye AYDAR
Şube Müdürü

Serkan IŞIK
Mali Hizmetler Uzmanı

Huri GÜNAY
Bilgisayar İşletmeni

Kastamonu Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.kastamonu.edu.tr

Mart 2017



“Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini kazanamamıştır. Ona alelade bir kütle denir, millet denemez. Bir kütle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline getirirler”

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	5
1-GENEL DEĞERLENDİRME	6
A- MİSYON VE VİZYON	5
B- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
C- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
D- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
E- 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
G- 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	16
1- Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
2- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	16
2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI	20
4- 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (Ek- 3)	36
5- 2016 YILI HARCAMALAR DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ek- 4)	37

SUNUŞ



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getirilerek; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporların idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esasları getirilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12' inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz; bilim ve sanat alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin mimari yapı ve turizm alanında kalkınmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

2006 yılında Kurulan Üniversitemiz de, farklı yerlerde bulunan fakülte ve yüksekokul binalarını yerleşkede toplamak, böylelikle yerleşik düzene geçebilmek ve uygun olmayan fiziki şartlarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin, geçerli standartlara uygun, altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış, gerekli donanım ve teknolojik imkanların sağladığı alanlar oluşturmak başlıca görevlerimiz arasında yer almıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25' inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programı İzleme Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Seyit AYDIN
Rektör



I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Kastamonu Üniversitesi; Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke kalkınmasına katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, bütün mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

VİZYON

Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla, eğitim ve topluma destek alanında ulusal ve uluslararası seviyede tercih edilen bir dünya üniversitesi olarak ön sıralarda yer almak.

B- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI BİLGİ ÜRETİMİNDE VE BU BİLGİNİN KULLANIMINDA ETKİLİ OLMAK.

- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde faydalanılması suretiyle daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak
- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.
- Misyonlarını, rekabet avantajı sağlayacak şekilde oluşturmak ve yönetmek.

- Araştırma kurumsal yapısını nitel ve nicel olarak geliştirmek.
- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak.
- Lisansüstü öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.
- Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak.
- Öncelikli alanlara yönelik araştırmaların ve disiplinlerin arası çalışmaların artırılmasını sağlamak.
- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkileri geliştirmek.
- Üniversitenin araştırma alt yapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek.
- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.
- Hayat boyu eğitim faaliyetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmalarını artırmak.
- Toplumla yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.

Stratejik Amaç 2- EĞİTİM KALİTESİNİN VE MEZUNLARIN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINDA SÜREKLİLİK SAĞLAMAK.

- Geleneksel kent dokusu ve mimari yapılanması bakımından üstünlükleri olan Kastamonu'nun bu yapısına katkıda bulunacak bir üniversite yerleşkesinin oluşturulması
- Nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek.
- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini geliştirmek.
- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekanları geliştirmek.
- Eğitim programlarının kalitesini artırmak.
- Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemek.
- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.
- Örgün eğitimi uzaktan öğretim sistemi ile destekleyerek üniversitenin sunduğu eğitim hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak.
- Mesleki eğitim veren birimlerinde uygulamalı eğitim programının etkinliğini artırmak.
- Yabancı dilde eğitim ile dünyaya entegre olmak.
- Ulusal ve uluslararası seviyede nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.
- Programların diğer programlarla ilişkilerini tanımlamak ve geliştirmek.
- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini (yabancı dil, IT ve Bilgisayar donanımı vb.) sağlamak.

Stratejik Amaç 3- SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞARAK SOSYAL MESELELERLE ÇÖZÜM ÜRETMEK

- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Kastamonu ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek.
- Farklı iletişim kanalları kullanarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak.
- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 4- ÜNİVERSİTENİN İÇ PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAM VE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK.

- Kampüslerin fiziksel, mekânsal, teknolojik alt yapı ve güvenlik eksiklerini gidermek.
- Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve özlük hakları) artırmak.
- İdare (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.
- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.
- Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili idari destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.
- Yapı, çevre işleri ve mekânsal tesisat ile ilgili hizmetleri artırmak.
- Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliğini artırmak.
- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.
- Sosyal, kültürel ve sportif desteklerle yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek.
- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak engelsiz kampüs oluşturmak.
- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.
- Burs ve staj desteklerini artırarak öğrencileri desteklemek.
- Kampüslerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb.) giderilmesine katkıda bulunmak.
- Çevreye duyarlı bir kampüs oluşturmak.
- Üniversite personeli için lojman temin etmek.

Stratejik Amaç 5- ÜNİVERSİTENİN DEĞİŞİN ŞARTLARA UYUMUNU SAĞLAYACAK, HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK, KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRİLER REKABET VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTENİ ARTIRAN BİR KURUM OLMAK.

- Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek.
- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal alt yapıya sahip olmak.
- Alt birimlere ve mezunlara yönelik çalışmalarla üniversitenin aidiyet ve kurumsal kimliğini geliştirmek.
- Çalışanların profesyonel gelişimini artırmak.
- Girişimciliği teşvik eden ve katkı sunan bir organizasyon yapısı geliştirmek.
- Üniversite için gelir getirici öncelikli araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlara yoğunlaşmayı sağlamak.
- Kurum içerisinde demokratik bir kültüre ilişkin süreçler oluşturmak ve karar süreçlerinde katılımcılığı teşvik etmek.
- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Önceliklerimiz;

Nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması,
 Mevcut öğretim elemanlarına yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarının sağlanması,
 Eğitim mekanlarının günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde iyileştirilmesi,
 Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 Temel ve yardımcı ders araç- gereçlerinin geliştirilmesi,
 Kütüphane kaynaklarımızın artırılması,
 Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi,
 Uluslar arası değişim programlarına katılımın artırılması,
 Üst düzey dil eğitiminin sağlanması,
 Yeterli idari kadronun sağlanması,
 İdari personelin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayabilmek,
 Öğretim elemanlarını Bilimsel Araştırma Projelerine yönlendirmek,
 Çağdaş konularda araştırma yapılabilmesi için gerekli merkezlerin kurulması,
 Meslek kuruluşları ile ilişkilerin artırılarak, kariyer platformunun oluşturulması.

C- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel Bütçeli’ bir kurumdur.

Özel Bütçe Gelirleri

a. Hazine yardımı

b. Öz gelirler

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri)

D- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Kuzeykent yerleşkesi üniversitemizin merkez yerleşkesidir. Yerleşkemizde Rektörlük binası, Orman Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Mesleki Eğitim Atölyeleri, Merkezi Kafeterya ile kapalı ve açık spor tesisleri yer almaktadır. Ulaşım şehir ile yerleşke arasında düzenli toplu taşıma aracı ile sağlanmaktadır.

Yerleşke dışında, şehir merkezinde Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi, ilçelerde ise Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, Devrekani Meslek Yüksekokulu, İhsangazi Meslek Yüksekokulu, İnebolu Meslek Yüksekokulu, Küre Meslek Yüksekokulu, Taşkoprü Meslek Yüksekokulu ve Tosya Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

1- TAŞINMAZLAR

2016 Yılında Sahip Olunan Taşınmazların Dağılımı			
Açık Alan (m ²)		Kapalı Alan (m ²)	
Üniversiteye Ait Olan	1.039.370,25	Üniversiteye Ait Olan	115.952,68
Hazineye Ait Olan	1.405.072,11	Hazineye Ait Olan	93.840,84
Diğer	193.246,84	Diğer	-
Toplam	2.637.689,20	Toplam	209.793,52

Tablo 1- Kastamonu Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
Kuzeykent Kampüsü	979.805,92	1.090.067,84	-	2.052.944,70	Kamulaştırma-Tahsis
Kastamonu Tıp Fakültesi	14.374,66	199.241,16	-	215.613,82	Bedelsiz Devir-Tahsis
Eğitim Fakültesi (Çarşı)	-	25.209,54	-	25.209,54	Tahsis
Rektörlük (Merkez)	-	3.792,07	-	3.792,07	Tahsis
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	145,93	-	145,93	Tahsis
KASÜSEM	-	739,71	-	739,71	Tahsis
Abana S-M Yılmaz M.Y.O.	4.794,00	10.407,02	-	15.201,02	Kamulaştırma-Tahsis
Araç Rafet Vergili M.Y.O.	1.575,61	-	29.866,08	31.441,69	Devir-Kira
Bozkurt MYO	10.431,00	-	-	10.431,00	
Azdavay MYO	-	6.282,00	-	6.282,00	Tahsis
Cide Rıfat Ilgaz M.Y.O. ve Misafirhane	11.011,17	-	6.926,63	17.937,80	Bağış-Tahsis-Kamulaştırma
Çatalzeytin Kampüsü	-	46.828,18	-	46.828,18	Tahsis
Daday MYO	4.589,46	-	-	4.589,46	Hibe
Devrekani M.Y.O.	997,07	164,25	5.431,46	6.592,78	Kamulaştırma-Tahsis
İhsangazi M.Y.O.	-	-	37.525,00	37.525,00	Geçici Tahsis
İnebolu M.Y.O.	-	-	112.655,00	112.655,00	Kiralama
Küre M.Y.O.	-	-	842,00	842,00	Tahsis
Taşköprü M.Y.O.	-	28.622,34	-	28.622,34	Tahsis
Tosya M.Y.O.	22.438,42	-	-	22.438,42	Satın Alma
Toplam	1.039.370,25	1.405.072,11	193.246,84	2.637.689,20	

Tablo 2- Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	
Kuzeykent Kampüs Alanı	88.662,90	34.941.,49	123.604,39
Eğitim Fakültesi (Çarşısı)	-	11.077,84	11.077,84
Rektörlük (Merkez)	-	3.096,00	3.096,00
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	250,00	250,00
Yed-i Beyza Konağı	-	502,25	502,25
Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO	7.140,00	-	7.140,00
Araç Rafet Vergili MYO	3.378,20	2.961,88	6.340,08
Cide Rıfat Ilgaz MYO ve Misafirhane	1.176,00	5.925,00	7.101,00
Kastamonu MYO Çatalzeytin Kampüsü	-	12.300,00	12.300,00
Daday MYO	4.512,00	-	4.512,00
Devrekani MYO	-	1.225,00	1.225,00
İhsangazi MYO	-	9.275,00	9.275,00
İnebolu MYO	-	1.983,35	1.983,35
Küre MYO	-	1.599,00	1.599,00
Taşköprü MYO	-	8.704,03	8.704,03
Tosya MYO	4.318,20	-	4.318,20
Bozkurt MYO	3.395,38	-	3.395,38
Azdavay MYO	3.376,00	-	3.376,00
TOPLAM	115.952,68	93.840,84	209.793,52
Kastamonu Tıp Fakültesine ait 71.161,77 m ² alan Devir- Teslim İşlemlerinin fiziki olarak tamamlanmaması sebebiyle tabloya dahil edilmemiştir.			

Ayrıca Üniversitemizde 2016 yılı itibariyle 13 binek otomobil, 1 minibüs, 1 midibüs, 1 adet 27 kişilik otobüs, 2 adet 41 kişi üzeri otobüs, 4 adet pick-up ve 1 traktör bulunmaktadır.

2- MALİ BİLGİLER:

Bütçe uygulama sonuçlarına bakıldığında yaklaşık olarak hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Başkanlığımız merkezi bütçeden aktarılan ödenekten harcama yapmıştır.

2.1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.56.00.01-01.3.9.00-2-06.1	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	571.029,60	1.128.970,40
38.56.00.01-01.3.9.00-2-06.3	300.000,00	100.000,00	400.000,00	165.461,25	234.538,75
38.56.00.01-08.2.0.00-2-06.1	2.000.000,00	550.000,00	2.550.000,00	1.423.714,98	1.126.285,02
38.56.00.01-09.4.1.00-2-06.1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.298.057,69	2.701.942,31
38.56.00.01-09.4.1.00-2-06.4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
38.56.00.01-09.4.1.00-2-06.5	19.998.000,00	3.000.000,00	22.998.000,00	15.309.617,55	7.688.382,45
38.56.00.01-09.4.1.00-2-06.7	2.600.000,00	4.600.000,00	7.200.000,00	5.455.591,30	1.744.408,70
38.56.00.01-09.8.8.00-2-06.1	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

2.2- Mali Denetim Sonuçları:

Yapılan denetimlerde birimiz ile ilgili sorunla karşılaşılmamıştır.

E- 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Hedeflenen;

- 2016 yılı içerisinde Merkezi Kütüphane Binasının tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.
- İletişim Fakültesi binasının ihalesinin yapılarak inşaatına başlanması planlanmaktadır.
- Tören Alanı ve Saha Tanzimi ihalesinin yapılarak çalışmalara başlanması planlanmaktadır.
- Kastamonu Tıp Fakültesini devir işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.
- Su Ürünleri Fakültesi ile Spor Kompleksinin proje ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

- 2015 yılında sözleşmesi imzalanan Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alım İşinin tamamlanarak kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Yücebıyıklar Konağı Restorasyon işinin ihalesine çıkılarak çalışmalara başlanması planlanmaktadır.
- 2015 yılında sözleşmesi imzalanan Rektörlük Binası Makam Odası Yapım işinin tamamlanarak kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bakım Onarım İşinin ihalesine çıkılarak işin tamamlanması planlanmaktadır.
- Merkez Fakülte, Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulu Binaları Muhtelif Bakım Onarım işine ait ihalenin yapılması planlanmaktadır.
- İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokulu Binalarının Muhtelif Bakım Onarım İşleri için ihale yapılması planlanmaktadır.
- Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslik Tadilatlarının yapılması için ihale yapılması planlanmaktadır.
- Cide Konukevi Bakım Onarım işinin ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
- Önceki yıllarda tamamlanan işlere ait Geçici ve Kesin kabul işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

Gerçekleşen;

- Merkezi Kütüphane Binasının 14.04.2016 tarihinde Geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.
- İletişim Fakültesi binasının ihalesinin yapılarak 09.08.2016 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.
- Tören Alanı ve Saha Tanzimi ihalesinin yapılarak yükleniciye 13.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Kastamonu Tıp Fakültesini devir işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
- Su Ürünleri Fakültesi ile Spor Kompleksinin proje ihalesine çıkılmış olup, yükleniciye 02.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- 2015 yılında sözleşmesi imzalanan Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alım İşinin 01.07.2016 tarihinde kabulü yapılmıştır.

- 2015 yılında sözleşmesi imzalanan Rektörlük Binası Makam Odası Yapım işinin 08.01.2016 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- Yücebiyıklar Konağı Restorasyon işinin ihalesine çıkılarak 14.11.2016 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bakım Onarım İşinin ihalesine çıkılarak 08.07.2016 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.
- Merkez Fakülte, Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulu Binaları Muhtelif Bakım Onarım işinin 31.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış, 14.10.2016 tarihinde ise Geçici Kabulü yapılmıştır.
- İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokulu Binalarının Muhtelif Bakım Onarım İşleri için yükleniciye 27.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslik Tadilatlarının yapılması için yükleniciye 05.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Cide Konukevi Bakım Onarım işinin ihalesine çıkılarak yükleniciye 07.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Sivil havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatının 01.06.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- Kuzeykent Kampüsü Çevre Aydınlatması Led Armatür Dönüşüm işinin 24.05.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- Eğitim Fakültesi Otopark Yapım işinin 01.06.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- Kuzeykent Kampüsü Kanalizasyon hattı ve Elektrik Altyapısı Yapım işinin 19.01.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- Spor Tesisi İdari Hizmet Binasının 21.03.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- Kastamonu Meslek Yüksekokulu Derslik Binası Kantin Tadilatı işinin 08.06.2016 tarihinde Kesin kabulü yapılmıştır.
- Kastamonu Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesis Deprem Güçlendirme Bakım Onarım işinin 02.03.2016 tarihinde Kesin kabulü yapılmıştır.

F- 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1	BÜTÇE YILI		2016
2	YATIRIMCI KURULUŞ ADI		KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
3	TOPLAM PROJE SAYISI		9
4	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI		
	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRENİM SEKTÖRÜ		6 ADET
	EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜ		1 ADET
	DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ		1 ADET
	EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ		1 ADET
5	TOPLAM PROJE TUTARI	(¨)	229.475.000
6	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI	(¨)	120.284.000
7	YILI ÖDENEĞİ	(¨)	30.000.000
8	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	(¨)	20.208.000
9	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		
10	PARASAL GERÇEKLEŞME		
11	BİTEN PROJE SAYISI		5
12	DEVAM EDEN PROJE SAYISI		4
13	İHALE AŞAMSINDAKİ PROJE SAYISI		—
14	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI		—
15	BAŞLAMAMA NEDENLERİ		—
16	ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR		—
17	SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ		—
18	ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER		—

2016 yılı yatırım programında 9 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği 30.000.000,00 ₺ olan ödeneklerin 20.208.000 ₺'si 2016 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU

Kastamonu İli


Yılı :2016

Yatırımcı Daire: Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BİN TL

Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harc.	Yılı Ödeneği			Dönem Sonuna		Fiziki Gerç. %	Projenin Son Durumu
								Genel ve Katma Bütçeden	EKLEME	Toplam	Nakdi Harcaması	Nakdi Gerç.%		
Kampüs Altyapısı	2008H033330	EĞİTİM	KASTAMONU	33.000.000,00 TL	18.348.000,00 TL	2008-2017	19.982.000,00 TL	4.400.000,00 TL	0.	4.400.000,00 TL	176.000,00 TL	4%	5%	Devam Ediyor
Derslik ve Merkezi Birimler	2008H033340	EĞİTİM	KASTAMONU	125.000.000,00 TL	62.627.000,00 TL	2008-2017	90.029.000,00-TL	5.000.000,00 TL	0	5.000.000,00-TL	4.181.000,00-TL	84%	21%	Devam Ediyor
Etüt Proje İşleri	2016H033000	EĞİTİM	KASTAMONU	100.000,00-TL	0	2016-2016	0	100.000,00 TL	(+1.000.000)	1.100.000,00-TL	739.000,00-TL	67%	70%	Tamamlandı
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1995H050110	SPOR	KASTAMONU	17.000.000,00-TL	7.310.000,00 TL	1995-2017	10.273.000,00-TL	3.000.000,00-TL	(-3.000.000)	0	0	0	0	İhale aşamasında
Kast. Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları	2015H032940	EĞİTİM	KASTAMONU	30.000.000,00-TL	0	2015-2017	0	6.750.000,00 TL	0	6.750.000,00-TL	0	0	0	İnşaat Aşamasında
Yücebiyık Konağı Restorasyonu	2016H040070	KÜLTÜR	KASTAMONU	1.750.000,00-TL	0	2016-2017	0	1.500.000,00 TL	0	1.500.000,00-TL	0	0	0	Devam Ediyor
Muhtelif İşler -Yapı İşleri ve Teknik D.B.	2016H033010	EĞİTİM	KASTAMONU	7.047.000,00-TL	0	2016-2016	0	1.500.000,00 TL	(+2.000.000)	3.500.000,00-TL	3.380.000,00-TL	97,00%	97,00%	Tamamlandı
Muhtelif İşler -İdari ve Mali İşler D.B.	2016H033010	EĞİTİM	KASTAMONU	4.200.000,00-TL	0	2016-2016	0	4.200.000,00 TL	2.000.000,00-TL	6.200.000,00-TL	5.401.000,00-TL	87,00%	87,00%	Tamamlandı
Muhtelif İşler -Bilgi İşlem D.B.	2016H033010	EĞİTİM	KASTAMONU	1.450.000,00-TL	0	2016-2016	0	1.300.000,00 TL	936.000,00-TL	2.236.000,00-TL	1.985.000,00-TL	88,00%	88,00%	Tamamlandı
Yayın Alımları - Kütüphane ve D. D. B.	2016H033020	EĞİTİM	KASTAMONU	1.750.000,00-TL	0	2016-2016	0	1.750.000,00 TL	0	1.750.000,00-TL	1.743.000,00-TL	99,00%	99,00%	Tamamlandı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2012K120790	DKH/TEKN.	KASTAMONU	8.178.000,00-TL	0	2012-2016	7.678.000,00-TL	500.000,00 TL	1.800.000,00-TL	2.300.000,00-TL	2.300.000,00-TL	100,00%	100,00%	Tamamlandı
TOPLAM				229.475.000	88.285.000		120.284.000	30.000.000	4.736.000	34.736.000	19.905.000			

PROJE BAZINDA ÖDENEK/HARCAMA DAĞILIMI

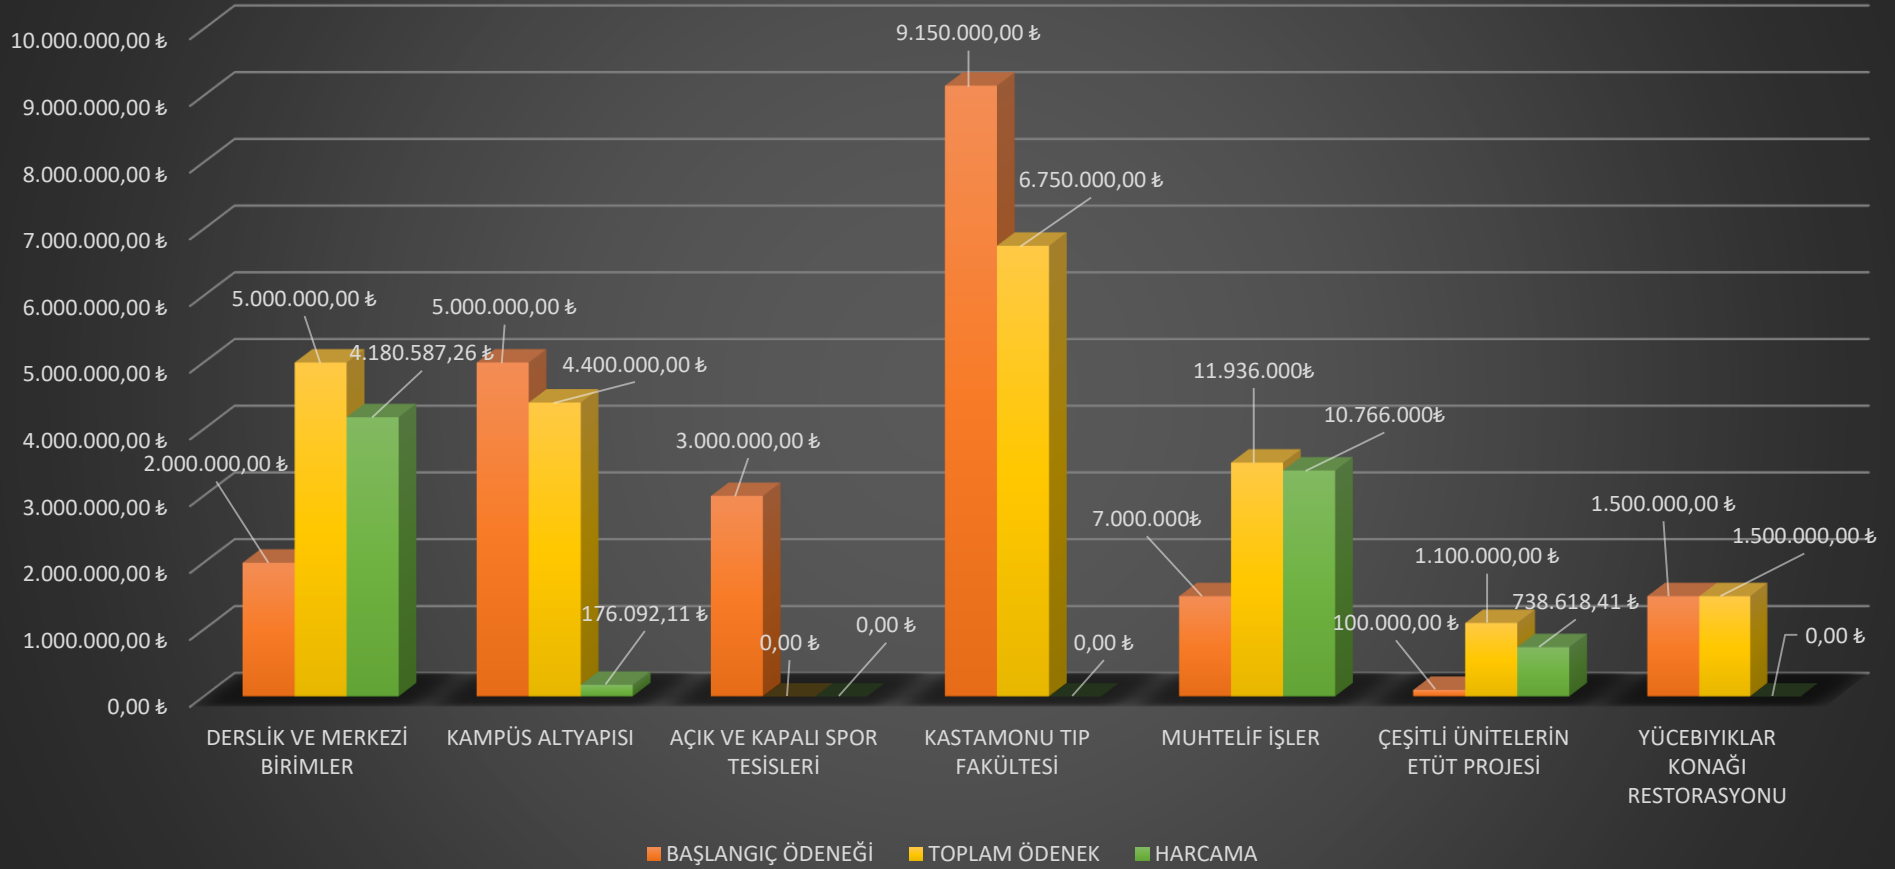

TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER

- 1. PROJE NO** : 2016H033000
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2016-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **100.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup 2016 yılı içinde Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden **400.000,00 ₺** ve Kampüs Altyapısı Projesinden **600.000,00 ₺** ödenek aktarılmıştır. Revize ödeneklerle beraber 2016 yılı toplam ödeneği **1.100.000,00 ₺**'ye ulaşmıştır. 2016 yılsonu itibari ile bu proje için **738.618,41 ₺**'lik harcama yapılmıştır.

KUZEYKENT YERLEŞKESİ ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

1.600.000,00 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

26.08.2015

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

26.08.2015

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

150 GÜN / 130 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ

01.07.2016

İŞİN SON DURUMU

KABULÜ YAPILDI.

606.699,02 ₺

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME







KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ VE SPOR KOMPLEKSİ
TÜM UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

285.500,00 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

29.08.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

02.09.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

180 GÜN

TAMAMLANACAĞI TARİH

28.02.2017

İŞİN SON DURUMU

% 50 'Sİ TAMAMLANDI.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

131.919,39 ₺



2. PROJE NO : 2016H033010
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2016-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **7.000.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Blokları Projesinden **2.000.000,00 TL** ödenek aktarılmıştır. Ayrıca Likit fazlasından **2.936.000,00 TL**, Gelir fazlasından ise **280.000,00-TL** ekleme yapılmıştır. Revize ödeneklerle beraber 2016 yılı toplam ödeneği **12.216.000,00 TL**'ye ulaşmıştır. 2016 yılsonu itibari ile **11.068.419,73 TL** harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI MAKAM ODASI YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	54.900,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	03.12.2015
İŞYERİ TESLİM TARİHİ	04.12.2015
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	25 GÜN / 7 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	08.01.2016
İŞİN SON DURUMU	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME	63.252,93 ₺

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BAKIM VE ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

64.995,00 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

26.05.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

30.05.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

40 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ

08.07.2016

İŞİN SON DURUMU

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

82.280,56 ₺

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZ FAKÜLTE, YÜKSEKOKULLAR
İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARI MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

1.146.669,00 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

27.05.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

31.05.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

120 GÜN / 15 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ

14.10.2016

İŞİN SON DURUMU

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

1.623.624,52 ₺

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İHSANGAZİ TAŞKÖPRÜ ABANA İNEBOLU
ÇATALZEYİN CİDE KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULLARI MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

1.484.490,31 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

23.05.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

27.05.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

150 GÜN

TAMAMLANACAĞI TARİH

23.10.2016

İŞİN SON DURUMU

GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

1.416.918,37 ₺

**GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK
TADİLATI****SÖZLEŞME BEDELİ****157.395,00 ₺****SÖZLEŞME TARİHİ****10.11.2016****İŞYERİ TESLİM TARİHİ****05.12.2016****İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE****45 GÜN****TAMAMLANACAĞI TARİH****18.01.2017****İŞİN SON DURUMU****% 95'İ TAMAMLANDI.****2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME****194.215,92 ₺**

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE KONUKEVİ BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

364.707,38 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

30.11.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

07.12.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

160 GÜN

TAMAMLANACAĞI TARİH

15.05.2017

İŞİN SON DURUMU

DEVAM EDİYOR.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

0,00 ₺

Ayrıca 2016 yılında; önceki yıllarda muhtelif işler kapsamında yapılan işlerden;

- Kastamonu Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesis Deprem Güçlendirme bakım Onarım ve Tadilat işinin Kesin Kabulü 02.03.2016 tarihinde yapılmıştır.
- Kastamonu Meslek Yüksekokulu Derslik Binası Kantin Tadilatı ve Onarım İşinin Kesin Kabulü 08.06.2016 tarihinde yapılmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Muhtelif İşlere ait **2016H033010** yatırım proje numarası ile 2016 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından,

- 2016/115528 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü için Cihaz Alımı İhalesine **400.729,06-TL**
- 2016/166879 Gıda Mühendisliği Bölümü için Laboratuvar Tezgah Sistemi ve Cihaz Alımı İhalesine **178.890,06-TL**
- 2016/169460 Kastamonu Üniversitesi 6 Grup Spor Malzemesi Alımı İhalesine **189.863,89-TL**
- 2016/335422 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için Malzeme (8 Grup) Alımı İhalesine **139.375,70-TL**
- 2016/380864 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için 12 Grup Malzeme ve Cihaz Alımı İhalesine **408.742,56-TL**
- 2016/440709 5 Kalem Cihaz Alımı İhalesine **118.472,00-TL**
- 2016/477231 Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin 4 Grup 23 Kalem Malzeme ve Cihaz Alımı İhalesine **127.693,70-TL**

TOPLAM - 1.563.766,97-TL ödeme yapılmıştır.

DMO'dan alımı gerçekleştirilen

Büro ve okul Mefruşat alımları, büro ve okullarda kullanılan makine teçhizat alımları ve laboratuvar malzemeleri alımları için toplam **3.837.385,02-TL** ödeme yapılmıştır.

TOPLAM: 5.401.151,99 -TL Ödeme yapılmış olup, ödeneğin % 87' si harcama olarak gerçekleşmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Muhtelif İşlerden 2.056.798,67.-TL alım gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Daire: Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı																
S.N.	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bişi Tarihi	Geçmiş Yıllar Harc.	Yıl Ödeneği			Dönem Sorunu		Fiziki Gerç. %	Projenin Son Durumu	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	Toplam	Nakit Harcaması	%			
1	Muhtelif İşler	2016H033010	Eğitim	Kastamonu	2.236.000,00 TL		2016-2016		2.236.000,00 TL		2.236.000,00 TL	106.436,00 TL	-	-	Tamamlandı	Sistem Odasında Kullanılan mevcut veri depolama sisteminin yetersiz kalması nedeniyle daha yüksek kapasiteli ve yeni teknoloji depolama sistemi alın
												207.664,42 TL			Tamamlandı	Sistem odasında kullanılan sunucuların yetersiz kalması nedeniyle halihazırda (Rarım) artırma, node artırma, ayrıca Üniversitemiz bütün sistemlerin güvenliği ve denetimini sağlayan mevcut güvenlik duvarının yetersiz kalması ve lisans süresinin 2016 Ağustos ayında dolması nedeni ile üst modellerden Dell Sonicwall 9200 modelinin alın.
												35.120,10 TL			Tamamlandı	Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılmak üzere Niteklili Elektronik Sertifika ve Mini Kart okuyucu alın
												51.271,00 TL			Tamamlandı	Üniversitemiz Birimlerinde ve Başkanlığımızda Kullanılmak Üzere Adobe Alan ve Kire Meslek Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Solidwork Alın
												106.436,00 TL			Tamamlandı	Sistem Odasında Kullanılan Mevcut Veri Depolama Sisteminin Yedekli Çalışabilmesi İçin Depolama Sistemi Alın
												63.082,80 TL			Tamamlandı	Loglama ve Hotspot işlemlerinin yapılabilmesi için Logsign Log Yönetim Yazılımı alın
												122.012,00 TL			Tamamlandı	Nüfuzluk depolama sistemi
												124.767,35 TL			Tamamlandı	Yeni sistem odasında üniversitemizin bütün sistemlerinin yedekli çalışabilmesi için 4 adet Switch alın
												225.925,67 TL			Tamamlandı	Yeni Açılacak olan binalarda kullanılmak üzere 19 Switch alın
												135.140,09 TL			Tamamlandı	Yeni Açılacak olan binalarda kullanılmak üzere 50 Adet Kablosuz İnternet Çıza Alın
												288,29 TL			Tamamlandı	Başkanlığımızda kullanılmak üzere tablet alın
												113.061,95 TL			Tamamlandı	Yeni açılacak olan binalarda kullanılmak üzere 57 adet kamera alın
												110.530,00 TL			Tamamlandı	Mevcut sistem odası ile yedekli çalışabilmesi için yeni sistem odasında kullanılmak üzere sunucu alın
												70.800,00 TL			Tamamlandı	MANTAM Türkçe arama motoru programı alın
												114.873,00 TL			Tamamlandı	Mevcut güvenlik duvarının yedekli çalışabilmesi için DELL SONICWALL alın
398.000,00 TL			Tamamlandı	Üniversitemiz Sistem Odası ve Güvenlik Merkezi Alınan Malzemesi Alın												
TOPLAM					0,00 TL				2.236.000,00 TL		2.236.000,00 TL	1.985.188,67 TL	88,78%	88,78%		

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif işler kapsamında 230.176,80.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

3. PROJE NO	: 2008H03340
PROJE ADI	: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	: 2008-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **2.000.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde **3.000.000,00 ₺** Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden aktarılmıştır. Revize ödenekle beraber 2016 yılı toplam ödeneği **5.000.000,00 ₺**'ye ulaşmıştır. 2016 yılsonu itibari ile **4.181.620,70 ₺** harcanmıştır.

MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	10.000.000,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	06.09.2013
İŞYERİ TESLİM TARİHİ	11.09.2013
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	750 GÜN / 123 GÜN
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ	14.04.2016
İŞİN SON DURUMU	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME	974.593,01 ₺





**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI VE
CEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ**

SÖZLEŞME BEDELİ

12.925.000,00 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

05.08.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

09.08.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

700 GÜN

TAMAMLANACAĞI TARİH

09.07.2018

İŞİN SON DURUMU

% 21'İ TAMAMLANDI.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

3.205.994,25 ₺

Ayrıca 2016 yılında; önceki yıllarda Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılan işlerden;

- Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal İnşaatının 01.06.2016 tarihinde Kesin kabulü yapıldı.
- Kütüphane su aboneliği için 1.033,44.-TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

4. PROJE NO : 2008H033330
PROJE ADI : KAMPÜS ALT YAPISI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2008-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **5.000.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin **600.000,00 ₺**'si Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi sektörüne aktarılmıştır. 2016 yılsonu itibari ile **4.400.000,00 ₺**'lik ödeneğin **176.092,11 ₺**'si harcanmıştır.

KAMPÜS İÇİ MUHTELİF YERLERDEKİ ALTYAPI VE ÜST YAPI İMALATLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI, TERFİ İSTASYONU KURULMASI, ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ VE TEL ÇİT İMALATI YAPIMI

SÖZLEŞME BEDELİ

1.370.439,88₺

SÖZLEŞME TARİHİ

24.08.2015

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

26.08.2015

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

100 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ

14.12.2015

İŞİN SON DURUMU

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

176.092,11 ₺

TÖREN ALANI VE SAHA TANZİMİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ

919.555,43 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ

06.12.2016

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

13.12.2016

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

180 GÜN

TAMAMLANACAĞI TARİH

10.06.2017

İŞİN SON DURUMU

DEVAM EDİYOR.

2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME

0,00 ₺

Ayrıca 2016 yılında; önceki yıllarda Kampüs Altyapısı projesi kapsamında yapılan işlerden;

- ✓ Kuzeykent Kampüsü Kanalizasyon Hattı ve Elektrik Altyapısı Hazırlanması işinin 19.01.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapıldı.
- ✓ Eğitim Fakültesi Otopark Yapım işinin 01.06.2016 tarihinde Kesin kabulü yapıldı.
- ✓ Kuzeykent Kampüsü Çevre Aydınlatması Led Armatür Dönüşüm İşinin 24.05.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapıldı.

- 5. PROJE NO : 1995H050110**
PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 1995-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **3.000.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin tamamı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 2016 yılsonu itibari ile bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2016 yılında; önceki yıllarda Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında yapılan işlerden;

- ✓ Spor Tesisi İdari Hizmet Binası Yapım işinin 21.03.2016 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır

- 6. PROJE NO : 2015H032940**
PROJE ADI : KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2012-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **9.150.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin **400.000,00 ₺**'si Etüt Proje İşlerine; **2.000.000,00 ₺**'si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. 2016 yılsonu itibari ile bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 23/07/2016 tarih ve 2016/8021 sayılı Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiş olup, söz konusu karar 21/08/2016 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devir teslim ile ilgili yasal prosedür işlemekte olup bu nedenle 2016 yılında herhangi bir imalat çalışması yapılamamıştır.

7. PROJE NO : 2016040070
PROJE ADI : YÜCEBIYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **1.500.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, 2016 yılsonu itibari ile bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

YÜCEBIYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU	
SÖZLEŞME BEDELİ	959.000,00 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	10.11.2016
İŞYERİ TESLİM TARİHİ	14.11.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	350 GÜN
TAMAMLANACAĞI TARİH	29.10.2017
İŞİN SON DURUMU	DEVAM EDİYOR.
2016 YILINDA YAPILAN ÖDEME	0,00 ₺

8. PROJE NO : 2016O033020
PROJE ADI : YAYIN ALIMI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ : 2016-2016

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile **1.750.000,00 ₺** ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin **1.743.279,21**

TL si harcanmıştır. .

Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödeme Adı	Ödenen Tutar
1	29.04.2016	Mantis Online İtibar Analizi ve Yönetimi	35.400,00
2	29.06.2016	İdeal Online	10.300,00
3	8.06.2016	Mikro(1.taksit)	313.491,60
4	8.06.2016	DeepKnowledge	17.125,93
5	8.06.2016	Turnitin ve Training	29.114,08
6	29.06.2016	Britannica Online	2.938,17
7	27.07.2016	Mikro Information(2.taksit)	410.953,50
8	20.10.2016	ACS	25.075,62
10	20.10.2016	SciFinderAcademic Unlimited	23.514,21
11	22.11.2016	Presreader	15.019,39
12	22.11.2016	Ebsco	119.649,89
13	22.11.2016	Mikro	142.722,31
14	22.11.2016	Ebsco. Nature Publishing Group	36.234,76
15	22.11.2016	Springer Ebook	67.614,07
16	22.11.2016	Jstor	23.979,81
17	1.12.2016	Türkiye Atıf Dizini	7.070,00
18	6.12.2016	Proquest	171.216,42
19	6.12.2016	Mikro Cabi	28.046,99
20	13.12.2016	Wiley Elektronik veri Tabanı	84.021,07
21	19.12.2016	Ebsco Gobi E booksPart1	87.029,42
		Yerli Kitap Alımı (Doğrudan Temin)	9.040,97
		Dmo Rfid	83.721,00
		TOPLAM	1.743.279,21

YAP-İSLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN BİNALARIMIZ**KAMPÜS ALANI ÇARŞI YAPIM İŞİ****İRTİFAK HAKKI BEDELİ**

24.000,00 ₺ (1. Yıl)

SÖZLEŞME TARİHİ

17.09.2012

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

03.04.2013

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

200 GÜN

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ2.430 m²**GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ**

—

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU

FAAL OLARAK ÇALIŞIYOR.



KAMPÜS ALANI YURT YAPIM İŞİ

İRTİFAK HAKKI BEDELİ

220.500,00 ₺ (1. Yıl)

SÖZLEŞME TARİHİ

01.11.2012

İŞYERİ TESLİM TARİHİ

01.04.2013

İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE

480 GÜN

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

30.000 m²

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ

—

İŞİN ŞU ANKI DURUMU

FAAL OLARAK ÇALIŞIYOR.

*** Yüklenici tarafından Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılmaya başlandı. İdare ile Yüklenici arasında Ek Protokol yapıldı.



HİBE OLARAK YAPILAN BİNA VE TESİSLERİMİZ

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU AZDAVAY KÜLLİYESİ

Azdavay Belediyesi öncülüğünde ve Azdavay Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Azdavay Yüksekokul Binası 3.376 m² kapalı alana sahip olup, 07.10.2016 tarihinde törenle hizmete açılmıştır. Maliyeti yaklaşık olarak 2.800.000,00 ₺'dir.



BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU

Bozkurt Dayanışma Derneği, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Eroğuz Ailesinin destekleriyle yaptırılan Kastamonu Üniversitesi Bozkurt İsmail Eroğuz Meslek Yüksekokulu Binası 24.09.2016 tarihinde törenle hizmete girdi.

3.395 m² kapalı alana sahip yüksekokul binasında; 6 laboratuvar, 12 derslik, 22 akademik ve idari personel odası, kütüphane, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, konferans salonu, mescit ve öğretim elemanı lokali bulunmaktadır.

Yaklaşık maliyeti 3.004.911,30 ₺'dir



DADAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hayır sever iş adamı Nafi Çeri ve oğlu Ümit Çeri tarafından binası yapılan, arsa tahsisini ise Daday esnaflarından Sadık Atalay'ın yaptığı 4.512 m² kapalı alana sahip Daday Meslek Yüksekokulu binasının Geçici Kabulü 22.11.2016 tarihinde yapıldı. Yaklaşık maliyeti 3.300.000,00 ₺'dir.



2016 YILINDA YAPILARAK SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İHALELERİMİZ

SIRA	İHALE KAYIT NO	İHALENİN ADI	YATIRIM PROJE	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	YÜKLENİCİ	BÜTÇE
1	2016/118360	Kastamonu Üniversitesi Abana, Araç, Cide, Çatalzeytin, İhsangazi, İnebolu, Küre, Taşköprü İlçelerinde bulunan Meslek Yüksekokulları Muhtelif Bakım ve Onarım İşi	MUHTELİF İŞLER 2016H033010	29.04.2016	23.05.2016	1.484.490,31	İLHAN YAMAK	06.7
2	2016/128678	Kastamonu Üniversitesi Merkez Fakülte, Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulu Binaları Muhtelif Bakım Onarım Yapım İşi	MUHTELİF İŞLER 2016H033010	12.05.2016	27.05.2016	1.146.669,00	ABDULVAHİT ÇUKUR- SEÇKİNLER İNŞAAT	06.7
3	2016/151440	Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bakım ve Onarımı İşi i	RÜCU EDİLECEK 06.7 DEN ÖDEMESİ YAPILDI	5.05.2016	26.05.2016	64.995,10	AHMET TIRPAN-MACRO İNŞAAT	RÜCU 06.7
4	2016/191703	Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası Bakımı ve Onarımı İşi	KESİN TEMİNAT	2.06.2016	17.06.2016	179.538,29	AHMET TIRPAN-MACRO İNŞAAT	TEMİNAT
5	2016/206058	Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 2008H033340	13.07.2016	05.08.2016	12.925.000,00	YAPI-SU İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.	06.5
6	2016/242197	K.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Binası Ve Spor Kompleksi Tüm Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmet Alım İşi	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD VE PROJESİ 2016H033000	25.07.2016	26.08.2016	285.500,00	KÜRE MÜŞAVİRLİK	06.5
7	2016/333688	Yücebiyıklar Konağı Restorasyonu İşi	2016H040070 YÜCEBİYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU	21.09.2016	10.11.2016	959.000,00	GEN İNŞ. TAAH. TUR. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	06.7
8	2016/431972	Tören Alanı ve Saha Tanzimi Yapım İşi	2008H033330 KAMPÜS ALTYAPISI	10.11.2016	06.12.2016	919.555,45	YAHYA ÜREGEN	06.5
9	2016/443421	Cide Konuk Evi Bakım ve Onarımı İşi	2016H033010 MUHTELİF İŞLER	14.11.2016	31.11.2016	364.707,38	AHMET TIRPAN-MACRO İNŞAAT	06.7
10	2016/469552	Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslikler Tadilatı İşi	2016H033010 MUHTELİF İŞLER	16.11.2016	31.11.2016	157.395,00	AHMET TIRPAN-MACRO İNŞAAT	06.7
11	2016/479898	Rektörlük Binası (Kuzeykent) Yatay Kondens Kapaklı Silikon Giydirmeye Cephe Kaplaması Tadilatı ve Onarım İşi	KESİN TEMİNAT	17.11.2016	02.12.2016	51.000,00	ABDULVAHİT ÇUKUR- SEÇKİNLER İNŞAAT	TEMİNAT

İPTAL EDİLEN İHALELERİMİZ

2016 YILINDA SIRA	İHALE KAYIT NO	İHALENİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE USULÜ	İPTAL NEDENİ
1	2016/437442	Rektörlük Binası (Kuzeykent) Yatay Kondens Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Kaplaması Tadilatı ve Onarım İşi	04.11.2016	Açık İhale	Teklif yaklaşık maliyetten yüksek
2	2016/430583	Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslikler Tadilatı İşi	31.10.2016	Açık İhale	Teklifler yaklaşık maliyetin üstünde
3	2016/400057	Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslikler Tadilatı İşi	18.10.2016	Açık İhale	Teklif sunan olmadığından
4	2016/313487	İHSANGAZI VE ÇATALZEYİN DEPREM TAHKİKİ YAPILMASI İŞİ	23.08.2016	Açık İhale	Geçerli teklifler yaklaşık maliyetin üstünde
5	2016/151590	Rektörlük Binası Bakım ve Onarımı	05.05.2016	Pazarlık Usulü-21/B	Teklif sunan olmadığından
6	2016/244805	Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Derslik Ve Kapalı Spor Salonu Binası İle Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çatalzeytin Yurt Ve Lojman Binalarının Deprem Tahkikinin Yapılması Ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi	29.06.2016	Pazarlık Usulü 21/F	İhale usulü değişti.
7	2016/118827	REKTÖRLÜK BİNASI EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILMASI	22.04.2016	Açık İhale	Teklif sunan olmadığından
8	2016/118798	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVAR BİNASI EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILMASI	22.04.2016	Açık İhale	Teklif sunan olmadığından
