

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU



MART 2018

T.C
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

HAZIRLAYANLAR

Şuayip CENGİZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Cevriye AYDAR
Şube Müdürü

Serkan IŞIK
Mali Hizmetler Uzmanı

Kastamonu Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.kastamonu.edu.tr

Mart 2018



“Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini kazanamamıştır. Ona alelade bir kütle denir, millet denemez. Bir kütle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline getirirler”

SUNUŞ



Kastamonu Üniversitesi bilim ve sanat alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin mimari yapı ve turizm alanında kalkınmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu amaçlarına ulaşmak için farklı yerlerde bulunan fakülte ve yükseköğretim binalarını yerleşkede toplamak, böylelikle yerleşik düzene geçebilmek ve uygun olmayan fiziki şartlarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin, geçerli standartlara uygun, altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış, gerekli donanım ve teknolojik imkânların sağladığı alanlar oluşturmak için çaba harcamaktadır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışmaktadır.

Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2017 yatırım programında; eğitim yükseköğretim sektöründe 6, eğitim kültür sektöründe 1, eğitim-spor sektöründe 1 ve DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe ise 1 olmak üzere toplam 9 yatırım projesi bulunmaktadır. Söz konusu projeler için merkezi yönetim bütçesinden 32.100.000.-TL ödenek konulmuş, yıl içinde likit kaynaklarımızdan 9.250.000.-TL ödenek eklenerek toplam 41.350.000.-TL'ye ulaşmıştır

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25' inci maddesi gereğince Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları 2017 yılı Yatırım Programı İzleme Değerlendirme Raporunda belirtilmiştir.

Kamuoyunun ve kurumları bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Seyit AYDIN
Rektör

İÇİNDEKİLER

1-GENEL DEĞERLENDİRME	6
1.1- VİZYON	6
1.2- MİSYON	6
1.3- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	7
1.4- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
1.5- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	12
1.6- 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	17
2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	22

TABLO VE GRAFİKLER

Tablo 1- Sermaye Bütçesi	10
Tablo 2-Bütçe Tertiplerine Göre Ödenek Durum Bilgileri Yerleşkeleri	11
Tablo 3- Kastamonu Üniversitesi	12
Tablo 4- Kapalı Alanların (M2) Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	13
Tablo 5- Akademik Personel	13
Tablo 6- Yabancı Uyruklu akademik Personel	14
Tablo 7- İdari Personel	14
Tablo 8- Öğrenci Sayılarımız	14
Tablo 9- Yatırım Projeleri Takip Çizelgesi	22
Tablo 10- Proje Bazında Ödenek/Harcama Dağılımları	23
Tablo 11-: Yatırım Projeleri İzleme Formu	37
Tablo 12- Yatırım Projeleri Takip Formu	38

1- GENEL DEĞERLENDİME

Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı yasa ile kurulmuştur. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar yeni kurulan Kastamonu Üniversitesine bağlanmıştır.

Kastamonu Üniversitesi 13 Fakülte, 3 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, 20 Merkez, 3 Bölüm ve 9 Koordinatörlükle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

1.1- MİSYON, VİZYON

Misyonumuz

Kastamonu Üniversitesi; Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke kalkınmasına katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, bütün mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

Vizyonumuz

Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla, eğitim ve topluma destek alanında ulusal ve uluslararası seviyede tercih edilen bir dünya üniversitesi olarak ön sıralarda yer almak.

1.2- ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır.

Stratejik Amaç 1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI BİLGİ ÜRETİMİNDE VE BU BİLGİNİN KULLANIMINDA ETKİLİ OLMAK.

Hedef 1- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde faydalanılması suretiyle daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak

Hedef 2- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.

Hedef 3- Misyonlarını, rekabet avantajı sağlayacak şekilde oluşturmak ve yönetmek.

Hedef 4- Araştırma kurumsal yapısını nitel ve nicel olarak geliştirmek.

Hedef 5- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak.

Hedef 6- Lisansüstü öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.

Hedef 7- Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak.

Hedef 8- Öncelikli alanlara yönelik araştırmaların ve disiplinlerin arası çalışmaların artırılmasını sağlamak.

Hedef 9- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkileri geliştirmek.

Hedef 10- Üniversitenin araştırma alt yapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek.

Hedef 11- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

Hedef 12- Hayat boyu eğitim faaliyetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmalarını artırmak.

Hedef 13- Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.

Stratejik Amaç 2- EĞİTİM KALİTESİNİN VE MEZUNLARIN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINDA SÜREKLİLİK SAĞLAMAK.

Hedef 1- Geleneksel kent dokusu ve mimari yapılanması bakımından üstünlükleri olan Kastamonu'nun bu yapısına katkıda bulunacak bir üniversite yerleşkesinin oluşturulması

Hedef 2- Nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek.

Hedef 3- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini geliştirmek.

Hedef 4- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânları geliştirmek.

Hedef 5- Eğitim programlarının kalitesini artırmak.

Hedef 6- Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemek.

Hedef 7- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 8- Örgün eğitimi uzaktan öğretim sistemi ile destekleyerek üniversitenin sunduğu eğitim hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Hedef 9- Mesleki eğitim veren birimlerinde uygulamalı eğitim programının etkinliğini artırmak.

Hedef 10- Yabancı dilde eğitim ile dünyaya entegre olmak.

Hedef 11- Ulusal ve uluslararası seviyede nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 12- Programların diğer programlarla ilişkilerini tanımlamak ve geliştirmek.

Hedef 13- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini (yabancı dil, IT ve Bilgisayar donanımı vb.) sağlamak.

Stratejik Amaç 3- SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞARAK SOSYAL MESELELERLE ÇÖZÜM ÜRETMEK.

Hedef 1- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Kastamonu ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek.

Hedef 2- Farklı iletişim kanalları kullanarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak.

Hedef 3- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 4- ÜNİVERSİTENİN İÇ PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAM VE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK.

Hedef 1- Kampüslerin fiziksel, mekânsal, teknolojik alt yapı ve güvenlik eksiklerini gidermek.

Hedef 2- Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve özlük hakları) artırmak.

Hedef 3- İdare (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 4- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 5- Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili idari destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 6- Yapı, çevre işleri ve mekânsal tesisat ile ilgili hizmetleri artırmak.

Hedef 7- Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 8- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 9- Sosyal, kültürel ve sportif desteklerle yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek.

Hedef 10- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak engelsiz kampüs oluşturmak.

Hedef 11- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 12- Burs ve staj desteklerini artırarak öğrencileri desteklemek.

Hedef 13- Kampüslerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb.) giderilmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 5- ÜNİVERSİTENİN DEĞİŞİN ŞARTLARA UYUMUNU SAĞLAYACAK, HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK, KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRİRER REKABET VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTENİ ARTIRAN BİR KURUM OLMAK.

Hedef 1- Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek.

Hedef 2- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal alt yapıya sahip olmak.

Hedef 3- Alt birimlere ve mezunlara yönelik çalışmalarla üniversitenin aidiyet ve kurumsal kimliğini geliştirmek.

Hedef 4- Çalışanların profesyonel gelişimini artırmak.

Hedef 5- Girişimciliği teşvik eden ve katkı sunan bir organizasyon yapısı geliştirmek.

Hedef 6- Üniversite için gelir getirici öncelikli araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlara yoğunlaşmayı sağlamak.

Hedef 7- Kurum içerisinde demokratik bir kültüre ilişkin süreçler oluşturmak ve karar süreçlerinde katılımı teşvik etmek.

Hedef 8- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

1.3- ÜNİVERSİTEMİZİN ÖNCELİKLERİ

- Ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek,
- Eğitim ve öğretimde kaliteyi ve verimliliği artırmak,
- Üniversitemizin araştırma ve eğitim stratejisini geliştirerek geleceğe yönelik araştırma alanları belirlemek,
- Üniversitemizin finansman kaynaklarını geliştirmek ve gelirlerini artırarak elde edilen gelirlerden yeni proje ve yatırımlara kaynak sağlamak,
- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak,

1.4- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel Bütçeli’ bir kurumdur.

Özel Bütçe Gelirleri;

1- Hazine yardımı

2- Öz gelirler

(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri)

1.4.1- Sermaye Bütçesi

1.000 TL

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ		25.998
Etüt Proje		498
Kampüs Altyapı		2.000
Derslik ve Merkezi Birimleri		9.000
Muhtelif İşler		8.000
Yayın Alımları		2.000

Kastamonu Tıp Fak. Eğit. Öğretim Blokları	4.500
EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ	1.600
Yücebiyıklar Konağı Restorasyonu	1.600
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SEKTÖRÜ	4.000
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.000
DHK-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	500
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500
KAMULAŞTIRMA	2
Kamulaştırma	2
TOPLAM	32.100

Bütçe Tertiplerine Göre Ödenek Durum Bilgileri

BİRİM	KBÖ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
İdari ve Mali İşler Daire Bşk. (06.1)	5.000.000	5.000.000	3.281.111	65,62
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. (06.4)	2.000	2.000	0	0
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. (06.5)	19.998.000	22.998.000	22.967.442	99,87
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. (06.7)	2.600.000	7.200.000	7.194.051	99,92
Kütüphane ve Dok. Daire Bşk. (06.1)	2.000.000	2.550.000	2.540.387	99,62
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.1)	1.700.000	1.700.000	1.544.435	90,85
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (06.3)	300.000	400.000	242.433	60,61
Rektörlük (Özel Kalem) (06.1)	500.000	1.500.000	1.500.000	100
TOPLAM	32.100.000	41.350.000	39.269.859	94,97

1.5- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Kastamonu Üniversitesi'nin İl merkezi ve ilçelerde toplam 16 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 2.637.586,74 m², kapalı alanı ise 209.793,30 m²'dir.

1.5.1- FİZİKSEL YAPI



Kastamonu Üniversitesi'nin toplam 16 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin açık alanları 2.637.586,74 m², kapalı alanları ise 209.793,30 m²'dir. Merkez yerleşkesinde Orman Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kastamonu Meslek Yüksekokulu binalarında eğitime devam edilmektedir. İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binalarının yapımı devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ

YERLEŞKELER	AÇIK ALAN (m ²)	KAPALI ALAN (m ²)
Kuzeykent Merkez Yerleşke	2.053.679,64	123.604,17
Kastamonu Tıp Fakültesi	213.615,82	0
Eğitim Fakültesi (Çarşı Yerleşkesi)	25.209,54	11.077,84
Rektörlük (Merkez)	3.938,00	3.346,00
İlçe Yerleşkeler	340.404,03	71.263,04
Diğer	739,71	502,25
TOPLAM	2.637.586,74	209.793,30

Ayrıca Kastamonu Merkezde Rektörlük (Merkez), Eğitim Fakültesi (Çarşı) ve Tıp Fakültesi ile ilçelerde 16 adet yerleşke bulunmaktadır. 2017 yılı içinde Hacettepe Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında Tıp Fakültesi binası devir işlemleri tamamlanamadığından yapım ihalesi gerçekleştirilememiştir.

KAPALI ALANLARIN (M2) HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

HİZMET ALANI	MERKEZ YERLEŞKE	MERKEZ DIŞI YERLEŞKE	TOPLAM
EĞİTİM	19.373,16	17.088,50	36.461,66
İDARİ	31.483,54	13.799,31	45.282,85
BARINMA	247,95	7.852,32	8.100,27
BESLENME	3.606,91	3.888,02	7.494,93
KÜLTÜR	10.282,14	0,00	10.282,14
SPOR	1.416,05	567,00	1.983,05
SOSYAL TESİS	3.626,30	1.832,62	5.458,92
DİĞER (DEPO, TESİS)	53.568,12	41.161,36	94.729,48
TOPLAM	123.604,17	86.189,13	209.793,30

1.5.2- İNSAN KAYNAKLARI

2017 yılı sonu itibari ile üniversitemizde 732 akademik personel, 392 idari personel, 22 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve 6 işçi olmak üzere toplam 1.152 personel görev yapmaktadır.

AKADEMİK KADRO SAYILARI

AKADEMİK PERSONEL	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM
PROFESÖR	43	45	88
DOÇENT	47	95	142
YARDIMCI DOÇENT	224	117	341
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	191	129	320
OKUTMAN	35	32	67
ÇEVİRİCİ	0	2	2
EĞİTİM-ÖĞRETİM PLAN.	0	2	2
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	182	143	325
UZMAN	10	13	23
TOPLAM	732	578	1310

YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

BİRİM ADI	PROFESÖR	DOÇENT	YARDIMCI DOÇENT	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	TOPLAM
Eğitim Fakültesi				1	1
Fen-Edebiyat F.	1	3	2		6
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.		1	3		4
İlahiyat Fakültesi			7	3	10
Mühendislik ve Mimarlık Fak.				1	1
TOPLAM	1	4	13	4	22

İDARİ PERSONEL SAYILARI

HİZMET SINIFI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri	264	320	584
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	23	276	299
Teknik Hizmetler Sınıfı	79	51	130
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	24	106	130
TOPLAM	392	756	1.148

1.5.3- ÖĞRENCİ SAYILARI

Kastamonu Üniversitesi Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer almak için hızla gelişmektedir. Üniversitemizde; eğitim-öğretim hizmetlerinde, çağdaş eğitim-öğretim esasına dayalı, Atatürk devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, eğitim öğretim gördüğü alanda bilgili ve donanımlı, toplumsal ve evrensel değerlere yürekten bağlı, kültürel ve sanatsal birikimlere ilgili ve duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmayı sağlamak için, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için erişilebilir hale getirme çabaları devam etmektedir.

GENEL ÖĞRENCİ SAYILARI

BİRİMLER	KIZ ÖĞRENCİ	ERKEK ÖĞRENCİ	TOPLAM
Fakülteler	7.709	6.524	14.233
Enstitüler	860	1.681	2.541
Yüksekokullar	395	804	1.199
Meslek Y. Okulları	7.326	3.752	11.078
TOPLAM	12.716	16.335	29.051



1.6- 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan 2. Stratejik Planını uygulamaktadır. Stratejik planda yer alan hedeflerimiz içerisinde büyük payı yatırımlar almaktadır. Gelişmekte olan bir üniversite olduğumuzdan fiziki yapıya büyük önem verilmektedir. Sermaye bütçesi hazırlanırken yeni hizmet binalarının yapılması, bu binaların büro tefrişatının eğitime uygun olması hedeflenmiştir.

2016 yılında yatırımlara yönelik hedeflerimize ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

1.6.1- YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1.6.1.1- HEDEFLenen

- 2016 yılında ihalesi yapılan Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Spor Kompleksi Tüm Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım işinin tamamlanarak kabulünün yapılması planlanmıştır.
- 2016 yılında başlanan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım işinin program dâhilinde yapımına devam edilmiştir.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının ihalesinin tamamlanarak inşaatına başlanması hedeflenmiştir.
- Tosya Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı ihalesinin yapılarak inşaatına başlanması hedeflenmiştir.

- 2016 yılında ihalesi yapılan Yücebıyıklar Konağı Restorasyonu işinin 2017 yılında tamamlanması öngörülmüştür.
- 2016 yılında ihalesi yapılan Tören Alanı ve Saha Tanzimi işinin tamamlanması hedeflenmiştir.
- Kuzeykent Kampüsü ile Kastamonu Tıp Fakültesi Kampüsündeki Altyapı ve Üstyapı İmalatları için ihaleye çıkılarak işlerin 2017 yılında tamamlanması öngörülmüştür.
- Spor Kompleksi için ihaleye çıkılarak inşaatına başlanması hedeflenmiştir.
- 2016 yılında ihalesi yapılan Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Spor Kompleksi Tüm Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım işinin tamamlanarak kabulünün yapılması planlanmıştır.
- Prefabrik İlkokul Yapım İşi ihalesine çıkılarak inşaatın 2017 yılında tamamlanması öngörülmüştür.
- Küre-Araç Meslek Yüksekokulları Derslik Binası için Bakım Onarım ihalesine çıkılarak işin 2017 yılında tamamlanması planlanmıştır.
- Kuzeykent Kampüsünde bulunan Çarşı Tadilat ihalesinin yapılarak işin 2017 yılında kabulünün yapılması amaçlanmıştır.
- 2016 yılında başlanan Kastamonu Üniversitesi Cide Konukevi Bakım Onarım işinin tamamlanarak 2017 yılında kabulünün yapılması hedeflenmiştir.
- Yüklenici Nam ve Hesabına Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ihaleye çıkılarak işin 2017 yılında tamamlanması öngörülmüştür.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası Makam Odası Yapım işinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bakım Onarım İşinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kastamonu Üniversitesi Merkez Fakülte, Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulu Binaları Muhtelif Bakım Onarım işinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Rektörlük Binası Bakım Onarım işinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Altyapı, Üstyapı İmalatları ve Çevre Düzenlemesi Yapılması Terfi İstasyonu Kurulması, Elektrik Hattı Çekilmesi ve Tel Çit Yapım İşinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.

- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan TM1 ve TM2 Arası Yüksek Gerilim Deplasesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Çevre Aydınlatması ve Kampüs İçi Fiber Sonlandırılması Yapım İşinin 2017 yılında Kesin Kabulü yapılacaktır.
- Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, gelişim sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçların 2016 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemek.

1.6.1.2- GERCEKLEŞEN:

- 2016 yılında ihalesi yapılan Yücebıyıklar Konağı Restorasyonu işinin 2017 yılında % 90'lık kısmı tamamlanmıştır.
- 2016 yılında başlanan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım işinin 2017 yılında % 90'lık kısmı tamamlanmıştır.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ait ihale 2017 yılında yapılarak inşaatın % 24'lük kısmı tamamlanmıştır.
- Tosya Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı işine ait ihale yapılmış olup işin %30'luk kısmı 2017 yılında tamamlanmıştır.
- 2016 yılında ihalesi yapılan Tören Alanı ve Saha Tanzimi işi tamamlanarak 28.07.2017 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- Kuzeykent Kampüsü ile Kastamonu Tıp Fakültesi Kampüslerindeki Altyapı ve Üstyapı işleri için ihaleye çıkılmış olup, 04.11.2017 tarihinde iş tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır.
- Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Yapım işine ait ihale yapılmış olup, inşaatın da %22'lik kısmı 2017 yılında tamamlanmıştır.
- 2016 yılında ihalesi yapılan Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Spor Kompleksi Tüm Uygulama Projeleri Hizmet Alım işinin tamamlanarak 03.04.2017 tarihinde işin Kabulü yapılmıştır.
- Prefabrik İlkokul Yapım İşİ 2017 yılında tamamlanarak 03.08.2017 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.



- Küre-Araç Meslek Yüksekokulları Derslik Binası için Bakım Onarım ihalesine çıkılmış olup, işin 25.09.2017 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
- Kuzeykent Kampüsünde bulunan Çarşı Tadilat ihalesine çıkılmış olup, işin 17.11.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.
- Yüklenici Nam ve Hesabına Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ihaleye çıkılmış olup, iş tamamlanarak 14.09.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası Makam Odası Yapım işinin 07.02.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bakım Onarım İşinin 11.08.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kastamonu Üniversitesi Merkez Fakülte, Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulu Binaları Muhtelif Bakım Onarım işinin 06.11.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Rektörlük Binası Bakım Onarım işinin 01.11.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılacaktır.
- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Altyapı, Üstyapı İmalatları ve Çevre Düzenlemesi Yapılması Terfi İstasyonu Kurulması, Elektrik Hattı Çekilmesi ve Tel Çit Yapım İşinin 23.03.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.

- 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan TM1 ve TM2 Arası Yüksek Gerilim Deplasesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Çevre Aydınlatması ve Kampüs İçi Fiber Sonlandırılması Yapım İşinin 22.03.2017 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.

Tablo 1KUZEYKENT ÇARŞI 3D GÖRÜNTÜSÜ (ÖN CEPHE)



KUZEYKENT ÇARŞI 3D GÖRÜNTÜSÜ (ARKA CEPHE)



- 2016 yılında başlanan Kastamonu Üniversitesi Cide Konukevi Bakım Onarım işi tamamlanmış olup, 10.05.2017 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.

1.6.2- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEFLLENEN

- Üniversitemizde devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı, Makine-Teçhizat, Bilgisayar Teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirmek.

GERÇEKLEŞEN

- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Bilime ve Nanoteknoloji Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin ihtiyacı olan cihazların alımı gerçekleştirilmiştir.
- Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari Birimlerin büro mefruşatı ile okullarda kullanılmak üzere makine-teçhizat ve laboratuvar malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

1.6.3- KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEFLLENEN

- Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını sağlamak.
- Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanemizde uygulamak.

GERÇEKLEŞEN

- 2017 mali yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 06 Sermaye giderleri ekonomik kodundan Üniversitemizin eğitim öğretim politikaları ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda bu bütçenin 128.243,22 Türk Lirasını basılı kitapların alımında kullanılmıştır.
- 2 358.406,66 Türk Lirasını elektronik kaynak (veri tabanı, e-kitap, e-dergi) alımında ve kitapların güvenliği ve kütüphane hizmetlerinin hızlı ve kolay verilebilmesi için UHF RFID İstasyonu için 53.737,20 Türk Lirası harcama yapılmıştır.
- Toplamda 2.540.387,08 Türk Lirası harcama gerçekleştirilerek adı geçen bütçenin % 99.62 kullanılmıştır.

1.6.4- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEFLLENEN

- Üniversitemizde verilen bilgi işlem ve haberleşme hizmetlerini artırmak.

GERÇEKLEŞEN

- Üniversitemiz sunucularında ve bağlı birimlerin bilgisayarında kullanılmak üzere yıllık Microsoft kampüs antlaşması yapıldı.
- Üniversitemiz birimlerinin kablosuz internet sisteminde kullanılmak üzere kablosuz internet sistemi lisansı alındı.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmaz üzere switch, güvenlik kamerası, güvenlik merkezinde kullanılmaz üzere kamera kayıt sistemi ve video Wall cihaz alımı, klima ve güç kaynağının yedekli çalışabilmesi için aynı ürünlerin yedek alımları, cisco omurga switch ile yedekleme çalışması planlanan cisco 9508 omurga switch alımı, harici yedekleme ünitesi, internet ana girişlerinde kullanılmak üzere 12 adet Ethernet, 5 adet fiber switch alımı gerçekleştirildi.
- Yeni hizmete giren binaların internet bağlantılarında kullanılmaz üzere sitch, tablet bilgisayar, taşınabilir bilgisayar ve toner alımı gerçekleştirildi.
- Güvenlik Merkezi Kamera Kayıt Sisteminin yedeği olmak üzere kamere kayıt sistemi alımı gerçekleştirildi.
- Sistem odası sunucularında kullanılmak üzere Winserver ve sql server ve NCSS alımı gerçekleştirildi.
-

1.6.5- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HEDEFLLENEN

- Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvar ve Cihazlar) geliştirmek

GERÇEKLEŞEN

- Üniversitemiz araştırma merkezinde kullanılmak üzere 17 adet laboratuvar cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.

2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2017 yılı yatırım programında 9 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği 32.100.000,00 ₺ olan ödenekler 9.250.000,00-TL ödenek eklenerek 41.350.000,00-TL ye yükselmiştir. Bu ödeneklerin 39.269.859,14 ₺'si 2017 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

YATIRIM PTEJELERİ TAKİP ÇİZELGESİ

1	BÜTÇE YILI	2017
2	YATIRIMCI KURULUŞ ADI	KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
3	TOPLAM PROJE SAYISI	9
4	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	
	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRENİM SEKTÖRÜ	6 ADET
	EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜ	1 ADET
	DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	1 ADET
	EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ	1 ADET
5	TOPLAM PROJE TUTARI	286.365.000,00-TL
6	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI	133.407.000,00-TL
7	YILI ÖDENEĞİ	32.100.000,00-TL
8	EKLENEN ÖDENEK	9.250.000,00-TL
9	TOPLAM ÖDENEK	41.350.000,00-TL
10	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	39.269.859,14-TL
11	KALAN ÖDENEK	2.080.140,86
12	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%80
13	PARASAL GERÇEKLEŞME	%94,97
14	BİTEN PROJE SAYISI	3
15	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	6
16	İHALE AŞAMSINDAKİ PROJE SAYISI	-
17	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	-

2.1- PROJE BAZINDA ÖDENEK/HARCAMA DAĞILIMLARI

PROJE ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN	HARCAMA
Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	1.808.752
Derslik ve Merkezi Birimler	9.000.000	3.000.000	16.111.030
Kastamonu Tıp Fak. Eğit. Öğret. Blokları	4.500.000	0	0
Yücebiyıklar Konağı Restorasyonu	1.600.000	0	1.189.029
Açık ve Kapalı Spor Tesisi	4.000.000	0	4.842.690
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500.000	1.000.000	1.500.000
Muhtelif İşler	8.000.000	4.700.000	11.073.000
Yayın Alımları	2.000.000	550.000	2.540.387
Çeşitli Ünitelerin Etüt Pro.	498.000	0	204.971
TOPLAM	32.098.000	9.250.000	39.269.859

2.2- BİTEN PROJELER

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2017H033100	Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	Kastamonu Üniversitesi
2017H033110	Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	Kastamonu Üniversitesi
2017H033090	Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kastamonu Üniversitesi

PROJE NO 2017H033100

PROJE ADI MUHTELİF İŞLER

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 2017-2017

Muhtelif işler kapsamında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneye yıl içerisinde likit fazlamızdan 4.600.000.-TL ekleme, Yücebiyıklar Konağı Restorasyon projesinden ise 410.000.-TL aktarma yapılmış olup, Kastamonu Üniversitesi Prefabrik İlkokul Binası Yapımı, Kuzeykent Külliyesi çarşı tadilatı ve Küre-Araç Meslek Yüksekokulları derslik binası bakım onarım giderlerine 6.005.889.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ PREFABRİK İLKOKUL BİNASI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	916.000.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	33.397
SÖZLEŞME TARİHİ	14.06.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.06.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	50 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	03.08.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	1.120.288.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	1.120.288.-TL

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KÜRE-ARAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU DERSLİK BİNASI ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	188.122.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	28.06.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.07.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	80 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	25.09.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	214.880.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	214.880.-TL

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKEN KAMPÜSÜ ÇARŞI TADİLATI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	2.238.825.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	440.154.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	04.08.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.08.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	60/27 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	17.11.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	3.029.092.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	3.029.092



KUZEYKENT KÜLLİYESİ ÇARŞI ARKA GÖRÜNÜMÜ



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAÇ-İHSANGAZI-TAŞKÖPRÜ-İNEBOLU-ÇATALZEYTİN-CİDE-KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULLARI MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	1.484.490.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	23.05.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	27.05.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	150 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	05.07.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	1.416.918.-TL
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	239.706.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	1.656.625.-TL

**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI
VE CEVRE DÜZENLEMESİ BAKIM ONARIM İŞİ**

SÖZLEŞME BEDELİ	251.299.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	50.205.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	17.07.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	60 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	14.09.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	353.316.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	353.316.-TL

**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERSLİKLER TADİLATI**

SÖZLEŞME BEDELİ	157.395.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	30.11.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	05.12.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	45 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	30.12.2016
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	194.216.-TL
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	6.457.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	200.673.-TL

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE KONUKEVİ BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	364.707.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	70.826.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	30.11.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.12.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	160 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	10.05.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	508.226.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	508.226.-TL

KASTAMONU TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİ BİNA BAKIM ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	3.933.400.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	01.08.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.08.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	360 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %30
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	533.924.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	533.924.-TL

Muhtelif işler kapsamında, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 5.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari birimlerin Büro/Mefruşat, Makine-Teçhizat alımları için 3.281.111.-TL harcama gerçekleştirilmiştir

Muhtelif işler kapsamında, Bilgi İşlem Başkanlığına 2.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde likit fazlasından 55.000.-TL ödenek eklenmiş olup, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 1.786.000.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

	2017H033110
PROJE ADI	YAYIN ALIMI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2017-2017

PROJE NO	2017H033110
PROJENİN ADI	YAYIN ALIMI
HARCAMA BİRİMİ	KÜTÜPHANE VE DÖKMANTASYON DAİ. BŞK.
KULLANILABİLİR ÖDENEK	2.000.000.-TL
KURUM İÇİ AKTARMA	.
KURUM İÇİ ÖDENEK EKLEME	550.000.-TL
TOPLAM ÖDENEK	2.550.000.-TL
HARCAMA	2.540.387.-TL
KALAN ÖDENEK	9.613.-TL
NAKTİ GERÇEKLEŞME	% 99,62
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 70

PROJE NO	2017H033090
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2017-2017

2017 yılında Bütçe Kanunu ile 498.000.-TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılı içinde 290.000.-TL'lik kısmı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine aktarılmıştır. Kalan 208.000.-TL ödeneğin 204.971.-TL'si harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ VE SPOR KOMPLEKSİ TÜM UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	285.500.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	29.08.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	02.09.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	180/15 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	03.04.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	204.971.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	204.971.-TL

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 3D GÖRÜNÜM

SPOR KOMPLEKSİ 3D GÖRÜNÜM



2.3- DEVAM EDEN PROJELER

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2008H033330	Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	Kastamonu Üniversitesi
2008H033340	Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	Kastamonu Üniversitesi
2015H032940	Eğitim-Yükseköğretim	Kastamonu Tıp Fak. Eğit. Öğr. Blok.	Kastamonu Üniversitesi
2016H040070	Eğitim-Kültür	Yücebıyıklar Konağı Restorasyonu	Kastamonu Üniversitesi
1995H050110	Eğitim-Beden Eğitimi	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	Kastamonu Üniversitesi
2012K120790	DKH-Sosyal-Tek. Arş.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Kastamonu Üniversitesi

PROJE NO	2008H033330
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2008-2018

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 2.000.000.-TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin 190.000.-TL'si Açık ve kapalı Spor Tesisleri Projesine aktarılmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle 1.810.000.-TL ödeneğin 1.808.752.-TL'si harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÖREN ALANI VE SAHA TANZİMİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	919.555.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	66.129
SÖZLEŞME TARİHİ	06.12.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	13.12.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	180/40 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	28.07.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	1.156.669.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	1.156.669.-TL

TÖREN ALANI GÖRÜNÜMÜ

**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 GRUP ALTYAPI VE ÜSTYAPI İMALATLARI YAPIM İŞİ**

SÖZLEŞME BEDELİ	478.952.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	84.977.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	03.08.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.08.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	90 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Geçici Kabul Yapıldı
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	04.11.2017
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	627.115.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	627.115.-TL

PROJE NO	2008H033340
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2008-2018

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 9.000.000.-TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 3.000.000.-TL Likit ödenekten; 4.135.000.-TL Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden aktarılmıştır. Revize ödenekle beraber 2017 yılı toplam ödeneği 16.135.000.-TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 2017 yılsonu itibari ile 16.111.030.-TL 'lik kısmı harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	12.925.000.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	05.08.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.08.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	700 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %90
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	3.205.994.-TL
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	11.988.017.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	15.194.011.-TL

İLETİŞİM FAK. GENEL GÖRÜNÜŞÜ



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	11.375.000.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	11.04.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.04.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	480 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %24
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	3.253.137.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	3.253.137.-TL

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU İKMAL İNŞAATI

SÖZLEŞME BEDELİ	3.933.400.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	01.08.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.08.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	360 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %30
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	869.876.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	869.876.-TL

TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU İKMAL İNŞAATI



PROJE NO	2015H032940
PROJE ADI	KASTAMONU ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. ÖĞRT. BLOKLARI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2015-2018

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 4.500.000.-TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin 4.135.000.-TL'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesine; 365.000.-TL'si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine aktarılmıştır. 2017 yılsonu itibari ile bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 23/07/2017 tarih ve 2017/8021 sayılı Kararı ile Kastamonu Üniversitesi

Rektörlüğüne devredilmiş olup, söz konusu karar 21/08/2017 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2017 yılında binaların Üniversitemize devri ile ilgili çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle bu proje için herhangi bir harcama yapılamamıştır. Binalarla ilgili devir teslim işlemlerinin 2018 yılında tamamlanarak ikmal inşaatı ihalelerine çıkılması planlanmaktadır.

Ayrıca Kastamonu Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının ikmali için 23.01.2018 tarihinde ihale yapılmış olup, gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanacaktır.

TIP FAKÜLTESİ İLAVE POLİKİNİK 3D GÖRÜNTÜSÜ



TIP FAKÜLTESİ İLAVE POLİKİNİK BİNASI GÖRÜNÜM



PROJE NO	1995H050110
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	1995-2018

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 4.000.000.-TL ödenek verilmiş olup, 190.000.-TL Kampüs Altyapısı Projesinden, 290.000.-TL Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden, 365.000.-TL ise Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları Projesinden aktarılmıştır. 2017 yılsonu itibari ile toplam ödenek miktarı 4.845.000.-TL 'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 2017 yılsonu itibari ile 4.842.690.-TL'si harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SPOR KOMPLEKSİ VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ	18.745.000.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	23.06.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.06.2017
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	480 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %22
GEÇİCİ KABUL İTİBARİ TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	4.842.690.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	4.842.690.-TL




PROJE NO	2017H040070
PROJE ADI	YÜCEBİYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	2016-2017

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.600.000.-TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılı içinde 410.000.-TL'lik kısmı Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Kalan 1.190.000.-TL'lik ödeneğin 2017 yılsonu itibari ile 1.189.030.-TL'lik kısmı harcanmıştır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YÜCEBİYIKLAR KONAĞI RESTORASYONU

SÖZLEŞME BEDELİ	959.000.-TL
EK SÖZLEŞME BEDELİ	0
SÖZLEŞME TARİHİ	10.11.2016
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.11.2016
İŞİN SÜRESİ/EK SÜRE	350/180 Takvim Günü
İŞİN SON DURUMU	Fiziki Gerçekleşme %80
GEÇİCİ KABUL İTİBARI TARİHİ	
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	0
2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA	910.783.-TL
TOPLAM HARCAMA MİKTARI	910.783.-TL

YÜCEBİYIKLAR KONAĞI GENEL GÖRÜNÜM

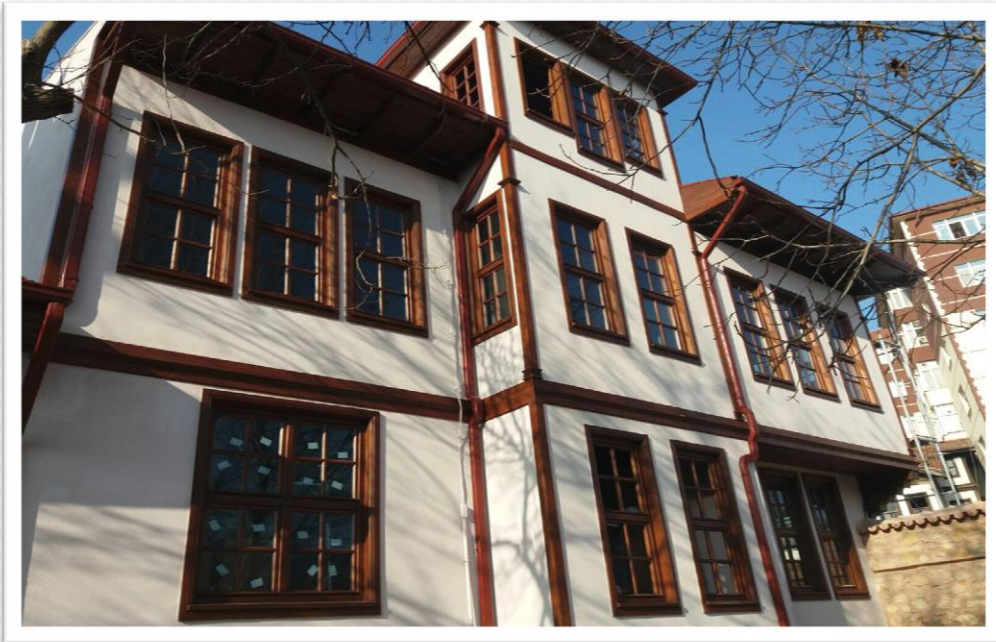

2.3- HİBE OLARAK YAPILAN BİNA VE TESİSLERİMİZ

TOBB TARAFINDAN YAPTIRILAN DEVREKANI MESLEK YÜKSEKOKULU



İlimiz Devrekani İlçesine Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 24 Derslikli Meslek Yüksekokulu yapımına ilişkin protokol 14.02.2013 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca bina yapımı ile ilgili sözleşme 17.12.2013 tarihinde imzalanmıştır. İnşaat 18.06.2017 tarihinde tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır. Devrekani Meslek Yüksekokulu binası toplam 7.751,19 m² kapalı alana sahip olup, toplam maliyeti 6.400.000,00 ₺'dir. Bina içerisinde 1 adet konferans salonu, 1 adet yemekhane, 1 adet kafeterya, 1 adet kütüphane ile derslik ve idari personel odaları yer almaktadır.

Yatırım Projeleri Takip Formu

1	BÜTÇE YILI	2017
2	YATIRIMCI KURULUŞ ADI	KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
3	TOPLAM PROJE SAYISI	9
4	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	
	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRENİM SEKTÖRÜ	6 ADET
	EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜ	1 ADET
	DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	1 ADET
	EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ	1 ADET
5	TOPLAM PROJE TUTARI	286.365.000,00-TL
6	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI	133.407.000,00-TL
7	İHALE BEDELİ	122.822.000,00-TL
8	YILI ÖDENEĞİ	32.098.000,00-TL
9	EKLENEN ÖDENEK	9.250.000,00-TL
10	TOPLAM ÖDENEK	41.348.000,00-TL
11	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	39.270.365,08-TL
12	KALAN ÖDENEK	2.077.634,92-TL
13	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%80
14	PARASAL GERÇEKLEŞME	%94,97
15	BİTEN PROJE SAYISI	4
16	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	4
17	İHALE AŞAMSINDAKİ PROJE SAYISI	1
18	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	—
